

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(44) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-I/विवध/2017-18

जयपुर, दिनांक 05 जनवरी, 2018

जिला कलक्टर ,
जिला समस्त ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के क्रियान्वयन के क्रम मे ।


प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण केन्द्र व राज्य सरकार की ग्रामीण आवासहीन एवं कच्चे आवास वाले परिवारो को आवास उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है। योजनान्तर्गत वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के मद्देनजर राज्य को वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक 6.75 लाख के लक्ष्य आवंटित है।

राज्य को वर्ष 2016-17 व 2017-18 में 250258 एवं 223629 के लक्ष्य आवंटित है, जिसकी प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 4.1.2018 को की गई, जिसमें अब तक की प्रगति को संतोषजनक बताते हुये और अधिक प्रयास कर माह सितम्बर 2018 तक राज्य को आवंटित 6.75 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशो की अनुपालना में राज्य को आवंटित 6.75 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य माह सितम्बर 2018 तक अर्जित करने बाबत निम्नानुसार कार्यवाही करावे :-

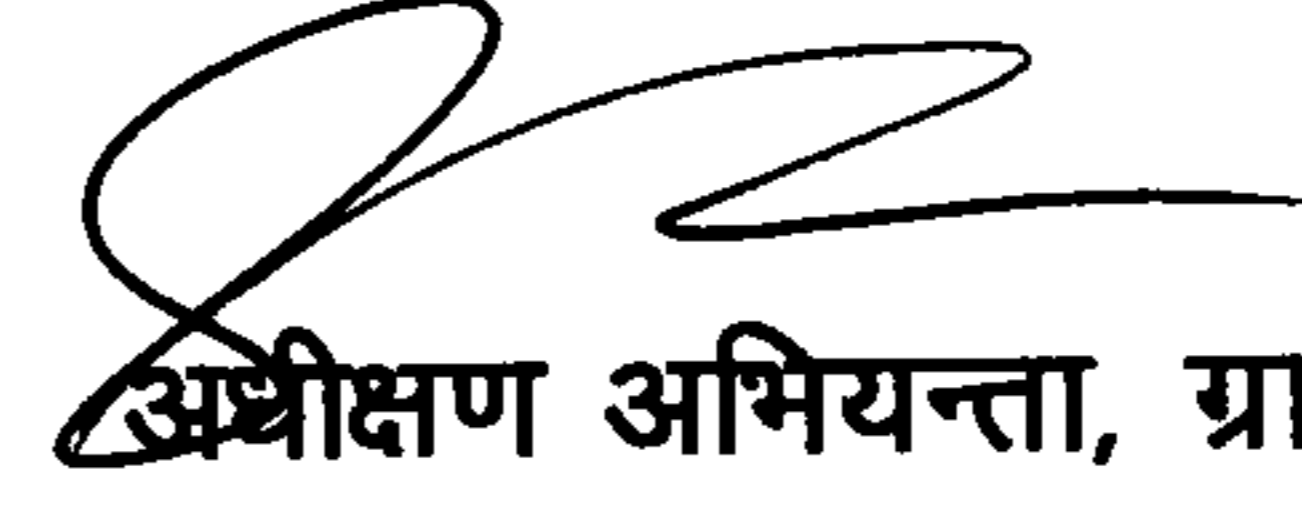
1. वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में स्वीकृत आवास जिनको द्वितीय किश्त जारी की जा चुकी है की प्रगति की नियमित समीक्षा कर **माह फरवरी 2018 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करावे।**
2. **वर्ष 2017-18 में स्वीकृत आवास जिनको द्वितीय किश्त जारी नहीं की गई है** की प्रगति की नियमित समीक्षा कर **को 31 जनवरी 2018 तक द्वितीय किश्त जारी कराते हुये माह मार्च 2018 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।**
3. वर्ष 2017-18 के आवंटित लक्ष्यो के साथ-साथ राज्य को आवंटित अतिरिक्त लक्ष्य 1.43 लाख के क्रम में जिले को आवंटित लक्ष्यो की स्वीकृतियां 31 जनवरी 2018 तक जारी कराकर 15 फरवरी 2018 तक प्रथम किश्त की राशि जारी करावे।

अतः उक्तानुसार जिलेवार विवरण संलग्न कर लेख है कि योजना की प्रतिदिन/नियमित समीक्षा कर उक्तानुसार लक्ष्यो की प्राप्ति सुनिश्चित करावे।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।


अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

Pmay G Progress 2016-17
Target for 2nd Inst issue & Completion

SN	District	Sanc.	Complete		Remaining	2nd Inst to be issue upto 15Jan18	Houses to be completed upto 31 Jan	Houses to be completed upto 28 Feb
			2nd	3rd	2nd			
1	AJMER	2527	2330	1901	197	197	429	197
2	ALWAR	1640	1539	798	101	101	741	101
3	BANSWARA	53872	51962	32818	1910	1910	19144	1910
4	BARAN	5975	5518	3266	457	457	2252	457
5	BARMER	12791	10821	3052	1970	1970	7769	1970
6	BHARATPUR	2156	1966	1094	190	190	872	190
7	BHILWARA	9552	9117	7062	435	435	2055	435
8	BIKANER	4950	4161	2639	789	789	1522	789
9	BUNDI	3909	3516	1817	393	393	1699	393
10	CHITTORGARH	9241	8403	4306	838	838	4097	838
11	CHURU	1396	1294	1082	102	102	212	102
12	DAUSA	2068	1881	1092	187	187	789	187
13	DHOLPUR	2471	2309	1499	162	162	810	162
14	DUNGARPUR	18875	15087	4057	3788	3788	11030	3788
15	HANUMANGARH	4629	4467	4326	162	162	141	162
16	JAIPUR	2256	1980	1368	276	276	612	276
17	JAISALMER	3095	2901	1839	194	194	1062	194
18	JALORE	12531	11212	5140	1319	1319	6072	1319
19	JHALAWAR	8271	7289	3180	982	982	4109	982
20	JHUNJHUNU	462	416	362	46	46	54	46
21	JODHPUR	11550	10220	6488	1330	1330	3732	1330
22	KARALI	4607	3437	737	1170	1170	2700	1170
23	KOTA	5195	4995	2658	200	200	2337	200
24	NAGOUR	4991	4781	4487	210	210	294	210
25	PALI	12157	11221	8451	936	936	2770	936
26	PRATAPGARH	6913	6033	801	880	880	5232	880
27	RAJSAMAND	2180	1768	877	412	412	891	412
28	SMADHOPUR	3135	2826	1522	309	309	1304	309
29	SIKAR	669	642	587	27	27	55	27
30	SIROHI	3691	3476	1762	215	215	1714	215
31	SRI GANGANAGAR	5642	5451	5057	191	191	394	191
32	TONK	5321	4692	2065	639	639	2627	639
33	UDAIPUR	21274	18177	4924	3097	3097	13253	3097
	Total	250005	226061	123735	23944	23944	102326	23944

Pmay G Progress 2017-18
Target for 2nd Inst issue & Completion

SN	District	Target	Issue		Remaining 2nd	2nd Inst to be issue upto 15Feb18	Houses to be completed upto 28 Feb	Houses to be completed upto 31 March
			2nd	Complete				
1	AJMER	3506	2581	826	925	925	1755	925
	ALWAR	2246	1003	69	1243	1243	934	1243
	BANSWARA	13657	7020	763	6637	6637	6257	6637
	BARAN	6105	3058	298	3047	3047	2760	3047
	BARMER	19091	6657	169	12434	12434	6488	12434
	BHARATPUR	2900	1526	76	1374	1374	1450	1374
	BHILWARA	5814	3618	748	2196	2196	2870	2196
	BIKANER	9016	2756	254	6260	6260	2502	6260
	BUNDI	9550	3441	159	6115	6115	3282	6115
	CHITTORGARH	2486	1191	74	1295	1295	1117	1295
	CHURU	5116	1243	137	3873	3873	1106	3873
	DAUSA	6241	1297	38	4944	4944	1259	4944
	DHOLPUR	2164	653	104	1511	1511	549	1511
	DUNGARPUR	15349	1975	30	13374	13374	1945	13374
	HANUMANGARH	3837	3158	1636	679	679	1522	679
	JAIPUR	3184	1601	251	1583	1583	1350	1583
	JAISALMER	3061	885	41	2176	2176	844	2176
	JALORE	6972	3893	447	3079	3079	3446	3079
	JHALAWAR	6725	2470	142	4255	4255	2328	4255
	JHUNJHUNU	496	220	30	276	276	190	276
	JODHPUR	8812	2987	360	5825	5825	2627	5825
	KARAULI	5551	468	23	5083	5083	445	5083
	KOTA	2583	1339	51	1244	1244	1288	1244
	NAGOUR	6237	4323	1234	1914	1914	3089	1914
	PALI	2175	1531	596	644	644	935	644
	PRATAPGARH	12147	2954	29	9193	9193	2925	9193
	RAJSAMAND	5032	705	18	4327	4327	687	4327
	SIKAR	4924	1282	55	3642	3642	1247	3642
	SIROHI	910	479	90	431	431	389	431
	SMADHOPUR	10178	4044	97	6134	6134	3947	6134
	SRI GANGANAGAR	7611	5184	1638	2427	2427	3546	2427
	TONK	3891	1358	68	2533	2533	1290	2533
	UDAIPUR	26056	3760	75	22296	22296	3685	22296
	Total	223629	81742	11073	141887	141887	70669	141887
