राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (101)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/S-N/विविध–I/2017–18 दिनांक 24 दिसम्बर, 2018

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत क्रियान्वयन की रैंकिंग हेतु प्रयुक्त Performance Index के विभिन्न मापदण्डों के क्रम में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण वर्ष 2016–17 से संचालित है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 हेतु राज्य को 6,87,091 आवास निर्माण के लक्ष्य प्राप्त है। माह दिसम्बर 2018 तक ये लक्ष्य पूर्ण किये जाने के निर्देश को संशोधित कर माह जनवरी 2019 तक पूर्ण कराये जाने के निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन की रैंकिंग का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत 9 निर्धारित पैरामीटर के आधार पर पंचायत समिति, जिला, राज्य की रैंकिंग प्रतिदिन जारी की जाती है। उल्लेखनीय है कि ये रैंकिंग OTP Based जिला स्तर व ब्लॉक स्तर लॉगिन पर भी उपलब्ध है। वर्ष 2017–18 में योजना के सफलतम कियान्वयन के फलस्वरूप राज्य को 2–7 लाख लक्ष्य श्रेणी में सर्वाधिक आवास पूर्ण करने हेतु प्रथम स्थान, कन्वर्जेंस में दूसरा स्थान, आवास पूर्ण की जिला श्रेणी में बांसवाडा को तृतीय स्थान, ब्लॉक घाटोल को प्रथम स्थान व ब्लॉक कुशलगढ को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

योजना की समीक्षा के दौरान पाया गया है कि निर्धारित अवधि में आवास पूर्ण नहीं करवाये गये है एवं Performance Index में 9 पैरामीटर्स में से भी कई पैरामीटर्स की तरफ समुचित ध्यान योजना क्रियान्वयन हेतु नामित अधिकारी/कार्मिकों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा भी विशेष रूप से आधार सीडिंग, प्रथम किशत हस्तानान्तरण एवं आवास पूर्णता के क्रम में राज्य की कम प्रगति को इंगित किया गया है।

Performance Index के मध्यनजर जिलेवार रैंकिंग की प्रति संलग्न कर लेख है कि योजना की समीक्षा के क्रम में पैरामीटर्स के सापेक्ष निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें–

1. **ग्राम सभा रिजोल्यूशन अपलोड करना** – योजना के अन्तर्गत तैयार की गई स्थाई वरीयता सूची का अनुमोदन ग्राम सभा में किया गया था जिसके प्रस्ताव की प्रति आवाससॉफ्ट पर अपलोड किये जाने का प्रावधान पंचायत समिति आवाससॉफ्ट आई.डी. पर उपलब्ध है जिसके संबंध में स्क्रीनशॉट परिशिष्ठ 1 पर संलग्न है। इस हेतु 10 अंक निर्धारित है, इस श्रेणी में सभी जिलों द्वारा 10 अंक वास्तव में प्राप्त हो चुके है परन्तु उक्त प्रस्ताव अपलोड नही किये जाने के कारण झुंझुनू, सीकर, सिरोही द्वारा क्रमशः 7.93, 8.80 व 8.83 अंक ही प्राप्त किये गये है। अतः निर्देश है कि सभी जिले इस पैरामीटर में प्राप्त किये जा चुके 10 अंक को वास्तव में प्राप्त करने हेतु बकाया ग्रामसभा प्रस्ताव अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।

2. **ग्राम पंचायत की वरीयता सूची निर्धारित कर अपलोड करना** – उपरोक्त बिन्दु 1 के समान कार्यवाही अपेक्षित है। इस हेतु भी 10 अंक निर्धारित है।
3. **आधार सीडिंग** – उक्त श्रेणी के अंतर्गत राज्य की प्रगति काफी निराशाजनक है। उल्लेखनीय है कि आधार सीडिंग किये जाने पर इस प्रगति का रिफलेक्शन महात्मा गांधी नरेगा योजना पर भी होगा, अतः इसकी सघन समीक्षा करवाकर यह कार्य पूर्ण करवाये जाने के विशेष प्रयास किये जावें।
4. **आवास स्वीकृत** – इस हेतु अधिकांश जिलों द्वारा निर्धारित 5 अंक प्राप्त कर लिये गय है, शेष 2687 स्वीकृतियां जिन जिलों द्वारा आचार संहिता के कारण जारी नहीं की गई हो, उन्हें 7 दिवस में जारी किया जाना सुनिश्चित करावें (संलग्न परिशिष्ट 2)।
5. **प्रथम किश्त हस्तानान्तरण** – इस हेतु अधिकांश जिलों द्वारा निर्धारित 7.5 अंक प्राप्त कर लिये गय है, शेष 14978 प्रथम किश्त जिन जिलों द्वारा आचार संहिता के कारण जारी नहीं की गई हो, उन्हें 7 दिवस में जारी किया जाना सुनिश्चित करावें (संलग्न परिशिष्ट 2)।
6. **द्वितीय किश्त हस्तानान्तरण, तृतीय किश्त हस्तानान्तरण एवं तृतीय किश्त हस्तानान्तरण उपरांत योजना का लोगो आदि का कार्य पूर्ण कर आवाससॉफ्ट पर अपलोड करना**– इन तीनों गतिविधियों हेतु क्रमशः 15, 17.5, एवं 25 अंक निर्धारित है। यहा विशेष उल्लेखनीय है कि आदिनांक 10,758 पूर्ण आवासों की लोगो आदि के अभाव/लापरवाही से पूर्णता का निरीक्षण आवाससॉफ्ट पर दर्ज नहीं है, जिसका समेकित विवरण परिष्टि 3 पर संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार Performance Index में शामिल सभी 9 पैरामीटर्स की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही संपादित करावें जिससे राज्य, जिले का योजना क्रियान्वयन में पूर्व में प्राप्त उच्चतम स्थान निश्चित रह सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव(ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
4. प्रभारी अधिशाषी अभियन्ता, ZP समस्त

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

C:\Users\Parag s\Desktop\Nahar SI\MS Word\Vividh.docx

Sl No.	Districts	Gram Sabha resolutions uploaded /no. of eligible GPs (10 %)	PWL uploaded /no. of eligible GPs (10 %)	Aadhar seeded /registered (10%)	Houses sanction /MoRD target (5%)	I-Installment /MoRD target (7.5%)	II-Installment /MoRD target (15%)	III-Installment /MoRD target (17.5%)	Houses completed /MoRD target (25%)	Overall Performance (%)	Rank
1	SRI GANGANAGAR	9.94	9.97	9.75	5.00	7.49	14.85	17.33	24.55	98.88	1
2	BANSWARA	10.00	10.00	9.50	5.00	7.50	14.92	17.41	24.41	98.74	2
3	HANUMANGARH	10.00	10.00	9.45	5.00	7.46	14.76	17.22	24.46	98.35	3
4	NAGAUR	9.72	9.94	8.57	5.00	7.47	14.76	17.23	24.46	97.15	4
5	AJMER	10.00	10.00	8.03	4.98	7.45	14.55	16.98	23.46	95.45	5
6	BARAN	10.00	9.95	9.15	4.99	7.47	14.59	17.02	21.65	94.82	6
7	PALI	10.00	10.00	9.19	4.99	7.49	14.42	16.83	21.71	94.63	7
8	JODHPUR	10.00	10.00	7.56	5.00	7.48	14.57	17.00	22.13	93.74	8
9	KOTA	10.00	10.00	8.14	5.00	7.48	14.60	17.03	21.44	93.69	9
10	BHILWARA	10.00	10.00	8.43	4.99	7.48	14.54	16.96	21.06	93.46	10
11	DHOLPUR	9.12	9.94	8.59	4.99	7.47	14.59	17.02	21.72	93.44	11
12	CHITTORGARH	9.97	10.00	8.09	4.97	7.45	14.40	16.80	21.13	92.81	12
13	UDAIPUR	9.69	9.94	6.57	5.00	7.46	14.45	16.86	22.54	92.51	13
14	JHUNJHUNU	7.93	9.97	7.11	5.00	7.48	14.30	16.68	23.04	91.51	14
15	JHALAWAR	9.96	10.00	6.47	5.00	7.48	14.55	16.98	21.02	91.46	15
16	CHURU	9.61	10.00	6.05	4.89	7.32	14.20	16.57	22.55	91.19	16
17	JALORE	10.00	10.00	8.12	5.00	7.48	14.46	16.87	19.19	91.12	17
18	DAUSA	10.00	10.00	7.31	4.95	7.40	14.32	16.70	20.27	90.95	18
19	BIKANER	9.38	9.97	5.07	5.00	7.47	14.45	16.86	22.56	90.76	19
20	SIROHI	8.83	10.00	7.18	5.00	7.47	14.44	16.84	20.88	90.64	20
21	JAISALMER	9.50	10.00	4.82	5.00	7.49	14.73	17.18	21.89	90.61	21
22	SIKAR	8.80	9.97	5.92	4.96	7.37	14.31	16.69	22.23	90.25	22
23	PRATAPGARH	10.00	10.00	6.93	4.97	7.43	14.28	16.66	19.67	89.94	23
24	BHARATPUR	9.92	9.97	4.28	5.00	7.49	14.69	17.14	21.06	89.55	24
25	JAIPUR	9.25	10.00	6.73	5.00	7.44	14.09	16.44	20.60	89.55	25
26	DUNGARPUR	10.00	9.86	5.47	5.00	7.49	14.43	16.84	20.24	89.33	26
27	BARMER	10.00	9.98	6.74	5.00	7.46	14.50	16.92	18.53	89.13	27
28	SAWAI MADHOPUR	9.85	10.00	6.83	5.00	7.48	14.23	16.60	19.02	89.01	28
29	BUNDI	10.00	10.00	6.24	5.00	7.50	14.46	16.86	18.09	88.15	29
30	ALWAR	9.33	9.76	5.81	4.96	7.42	14.45	16.86	19.14	87.73	30
31	RAJSAMAND	9.95	10.00	4.89	4.93	7.33	13.88	16.19	20.48	87.65	31
32	TONK	9.39	10.00	6.71	4.95	7.40	14.07	16.41	16.83	85.76	32
33	KARAULI	10.00	10.00	8.72	4.96	7.33	12.18	14.21	6.94	74.34	33

Step for uploading Gram Sabha Resolution Documents

1. Login from Block

2. Use Option "Upload files regarding SECC" for uploading Gram Sabha Resolution Documents

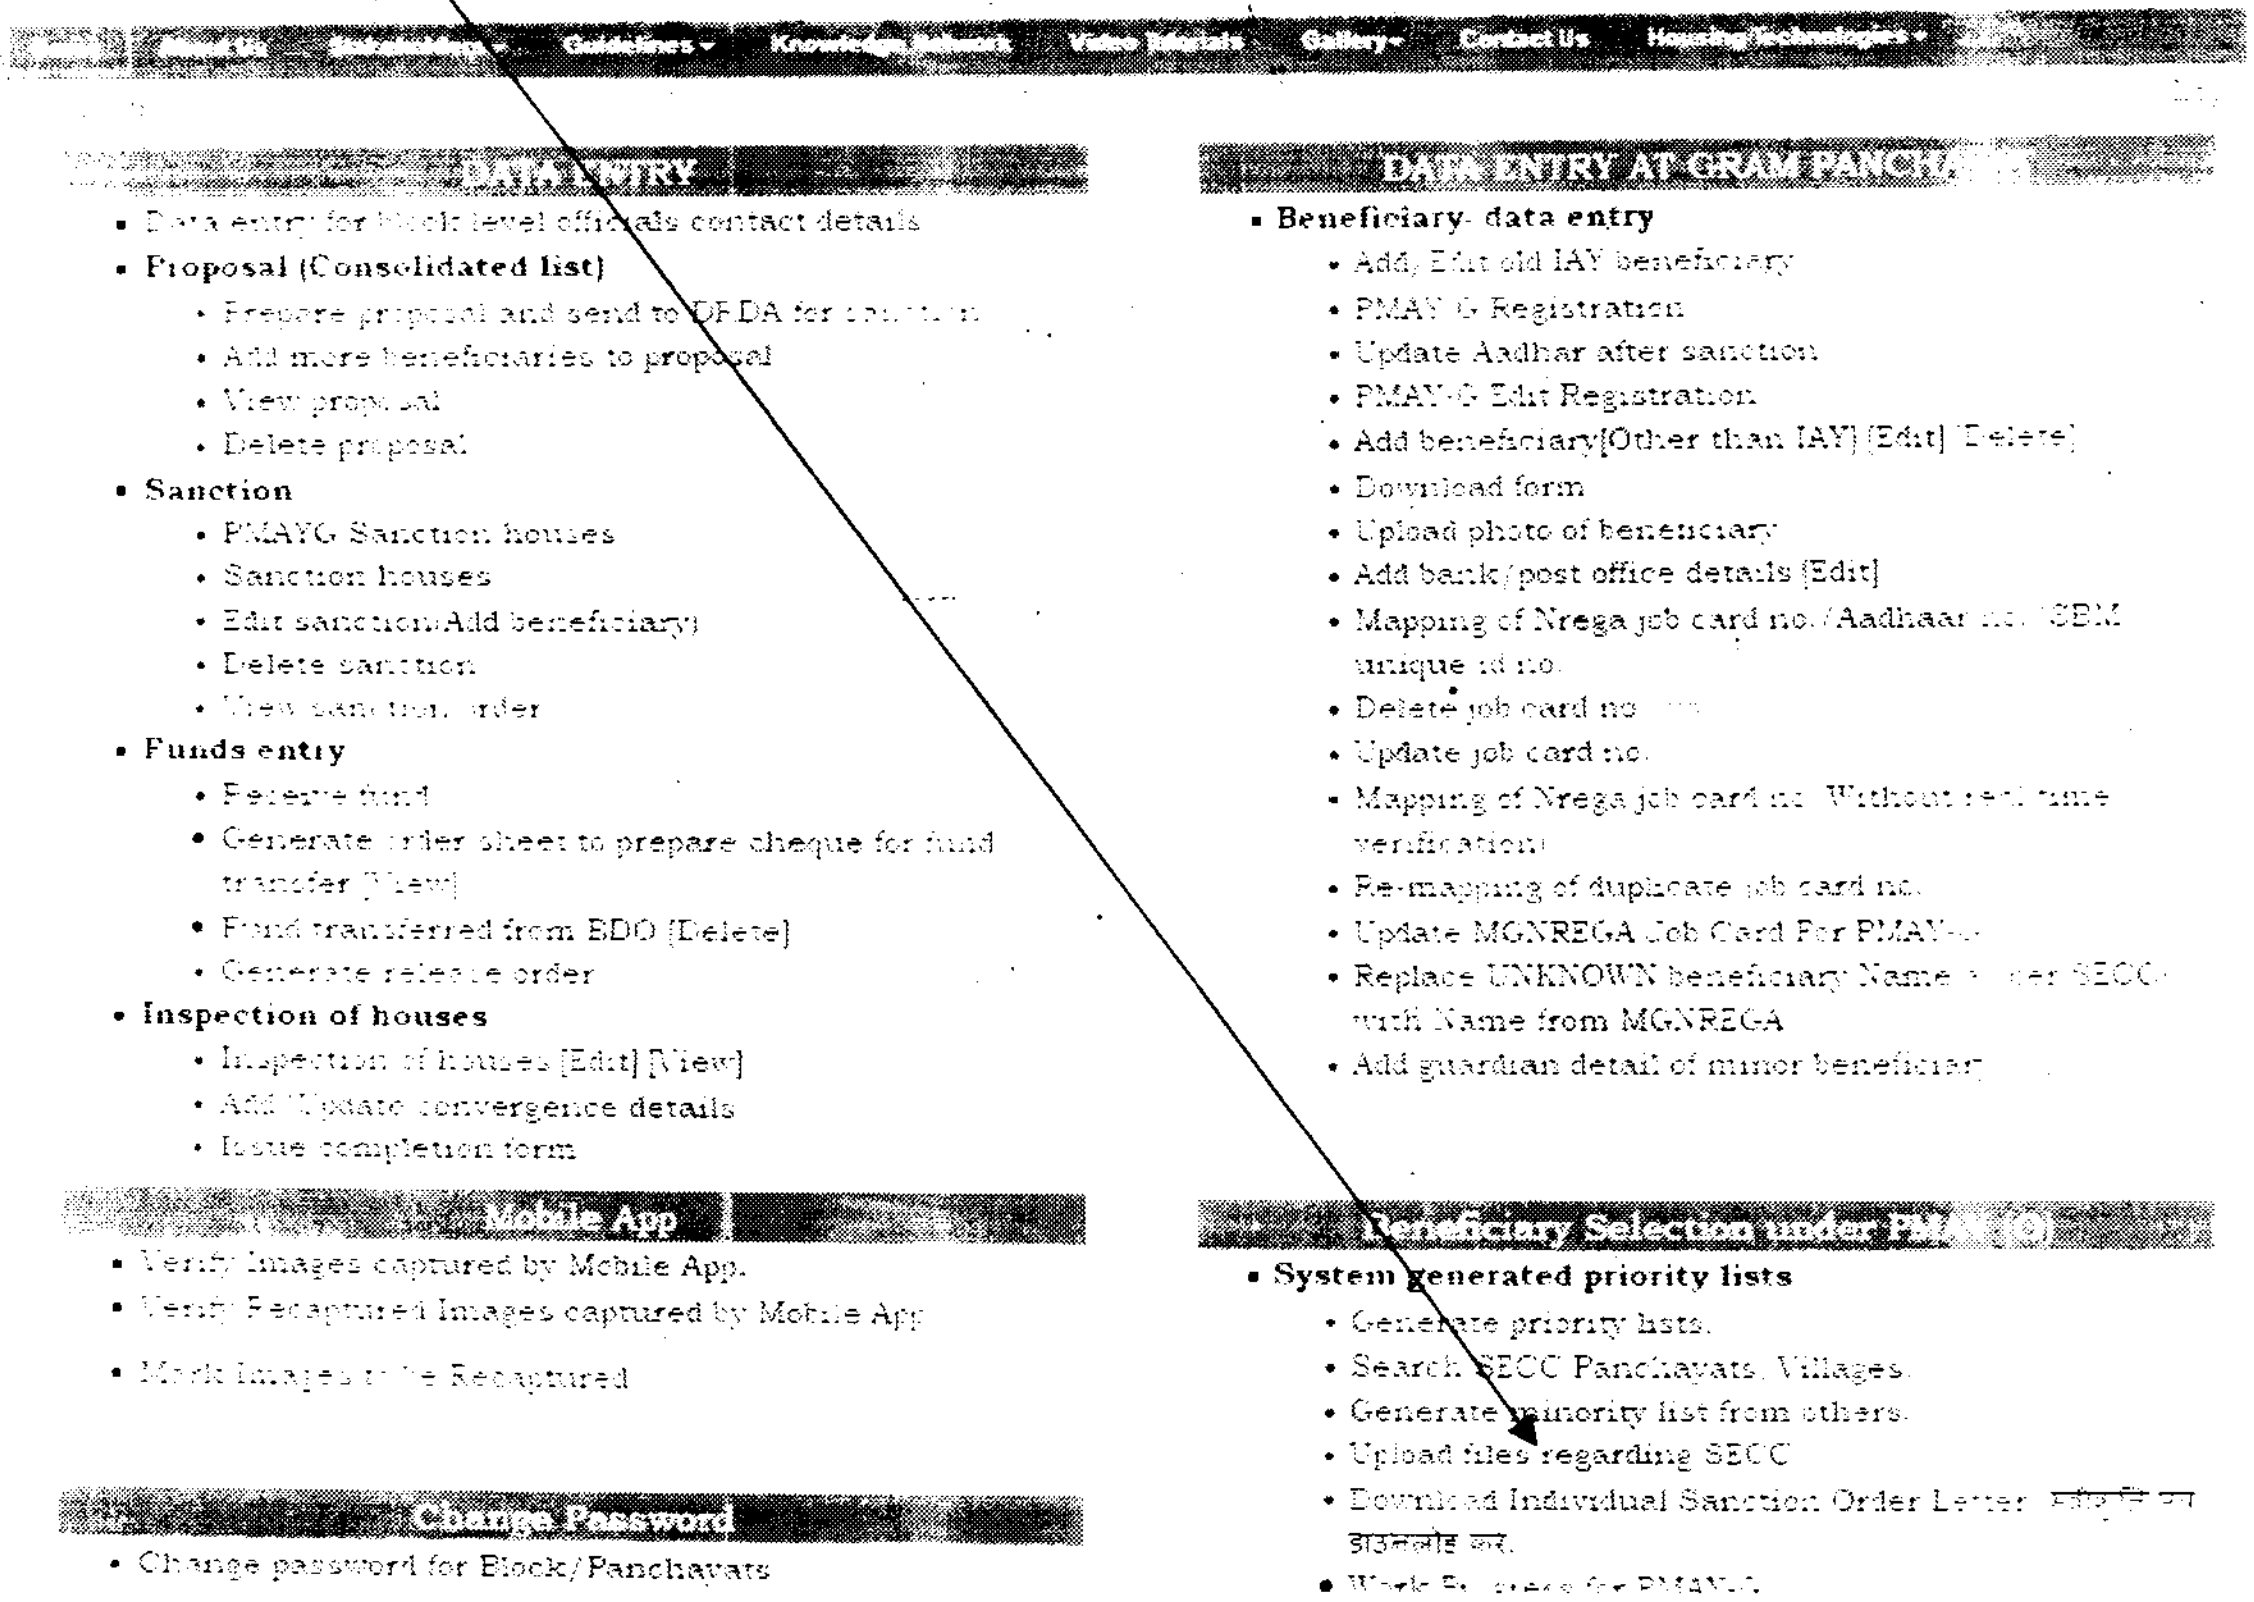

3. Upload only pdf file by using option "Browse"

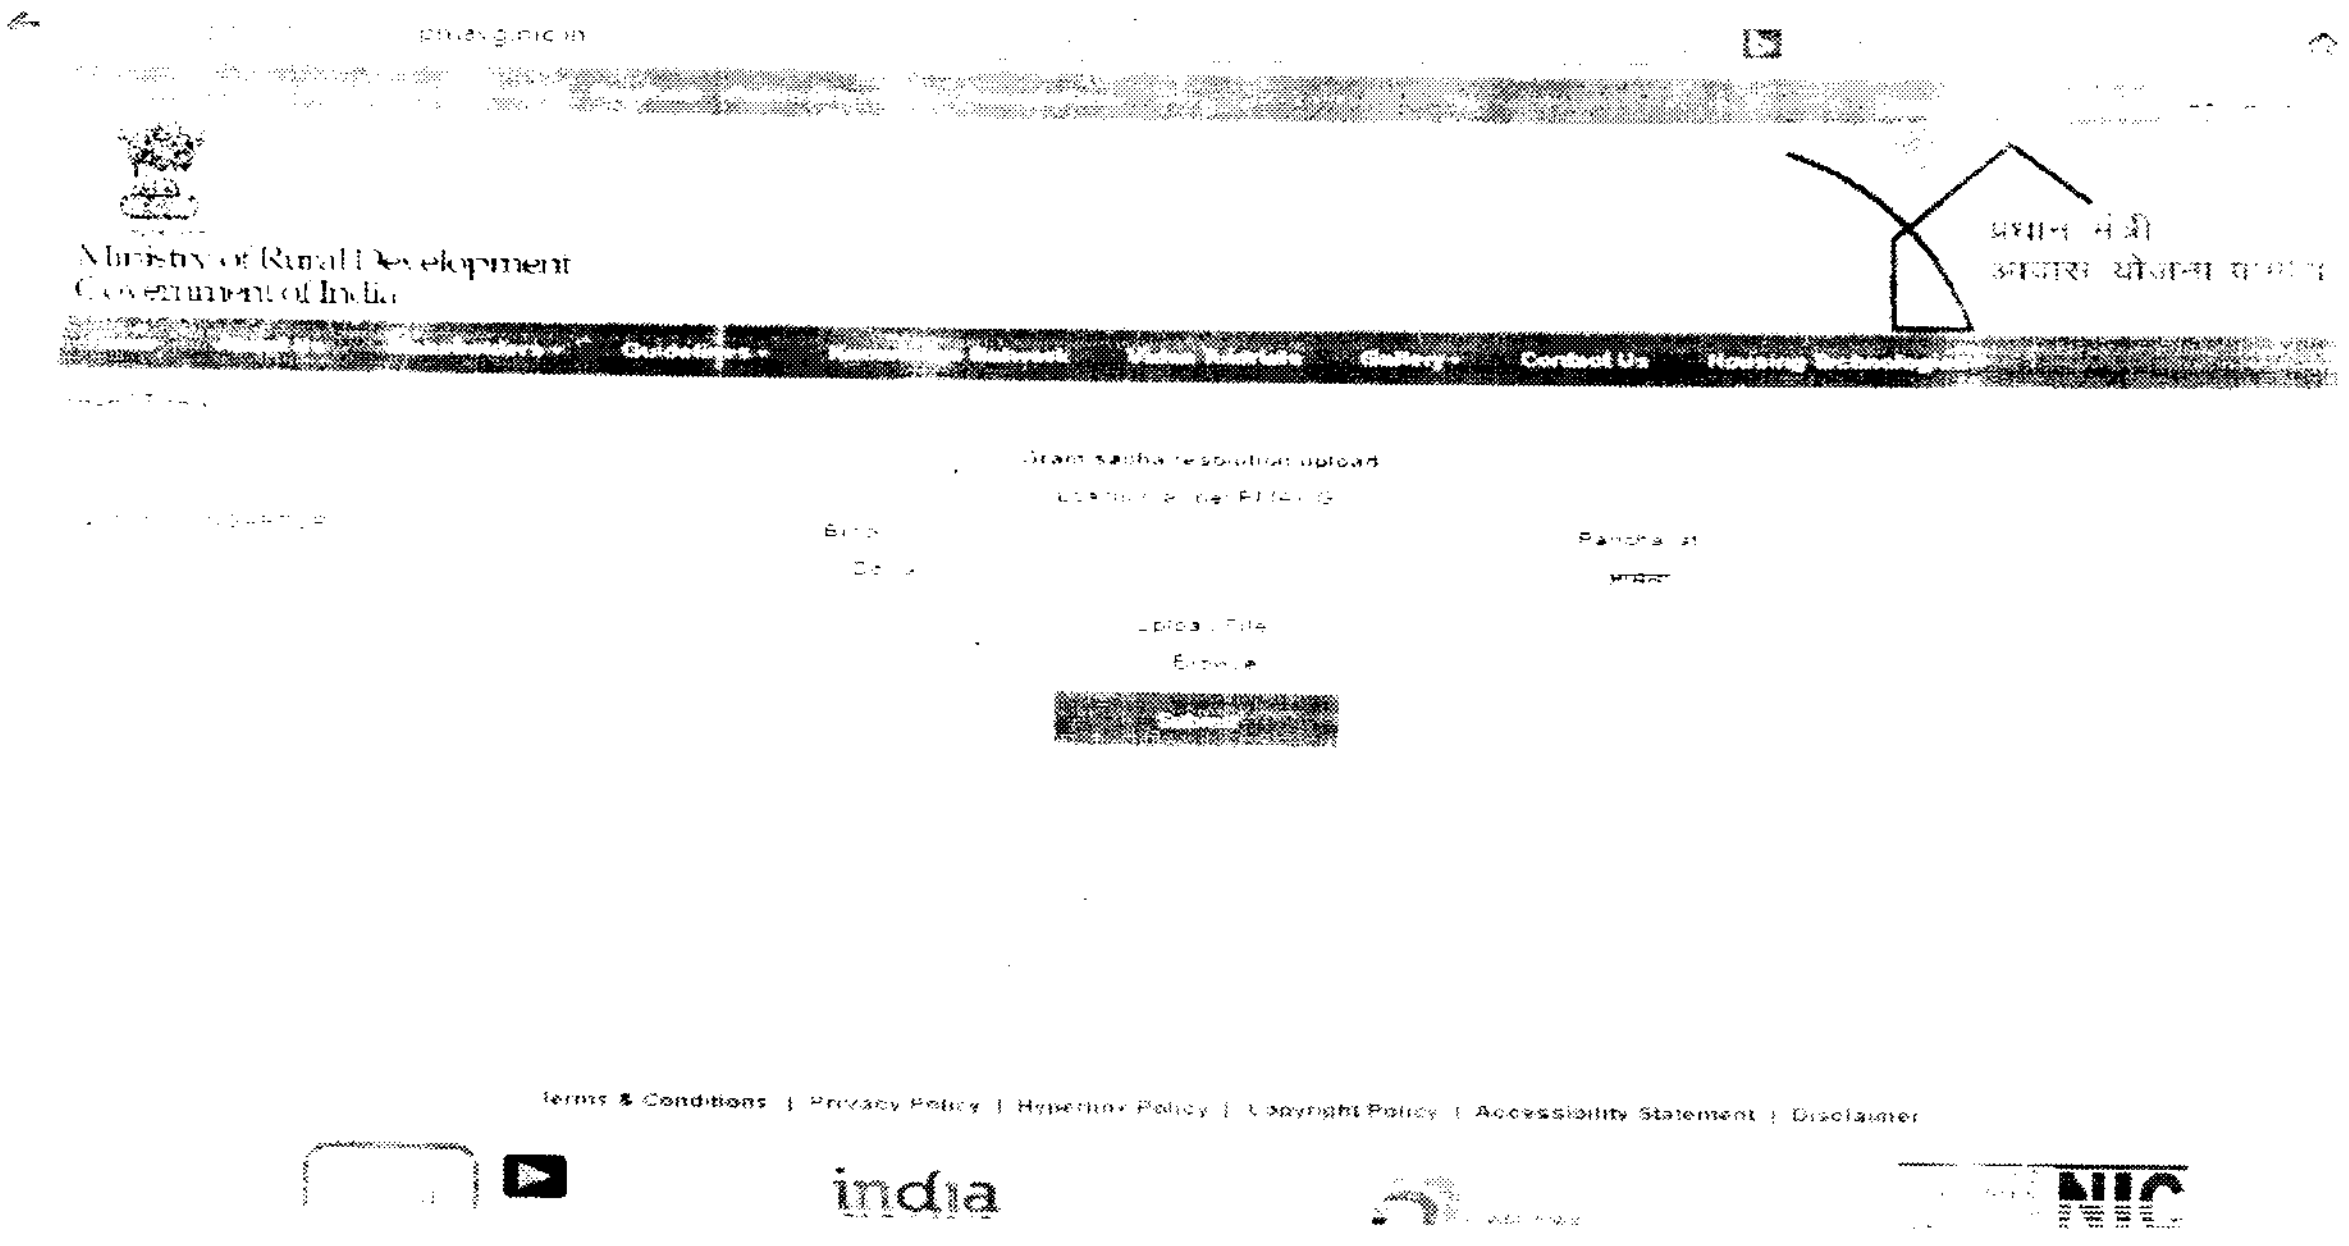

परिशिष्ट २

Pradhan Mantri Awaas Yojana- Gramin

Physical Progress as on 24-12-18

SNo	District Name	Target	Sanctions	Remaining Sanction	1st	Remaining 1st
1	AJMER	10703	10674	29	10598	105
2	ALWAR	5828	5797	31	5711	117
3	BANSWARA	82152	82151	1	81660	492
4	BARAN	17697	17677	20	17576	121
5	BARMER	58680	58592	88	57237	1443
6	BHARATPUR	6844	6843	1	6804	40
7	BHILWARA	21071	21052	19	20926	145
8	BIKANER	21896	21898	-2	21520	376
9	BUNDI	18518	18519	-1	18363	155
10	CHITTORGARH	14425	14343	82	14309	116
11	CHURU	14724	13504	1220	12394	2330
12	DAUSA	8622	8532	90	8487	135
13	DHOLPUR	5058	5046	12	5032	26
14	DUNGARPUR	57134	56529	605	55553	1581
15	HANUMANGARH	13007	13001	6	12905	102
16	JAIPUR	8617	8614	3	8447	170
17	JAISALMER	12044	12043	1	11181	863
18	JALORE	27057	27055	2	26785	272
19	JHALAWAR	21582	21582	0	21095	487
20	JHUNJHUNU	1046	1044	2	1034	12
21	JODHPUR	27516	27516	0	27292	224
22	KARAULI	12591	12510	81	11518	1073
23	KOTA	10547	10541	6	10504	43
24	NAGAUR	15913	15912	1	15734	179
25	PALI	16155	16140	15	16050	105
26	PRATAPGARH	29043	28942	101	28604	439
27	RAJSAMAND	10289	10182	107	10041	248
28	SAWAI MADHOPUR	11465	11464	1	11087	378
29	SIKAR	2439	2425	14	2342	97
30	SIROHI	16804	16804	0	16667	137
31	SRI GANGANAGAR	21244	21244	0	20819	425
32	TONK	17922	17829	93	17332	590
33	UDAIPUR	68458	68399	59	66506	1952
	Total	687091	684404	2687	672113	14978

परिशिष्ट - 3

A.4 Gap between Stages: Account Verification to House Completion 2016-17 to 2018-19 Date 24.12.2018

#SNo	District Name	1st Instalment released	Inspected for 2nd	Balance 2nd Inspection	2nd Instalment released	Inspected for 3rd	Balance 3rd Inspection 24.12.2018			Balance 3rd Inspection 21.12.2018	Progress Yesterday	3rd Instalment released	Complete	Balance inspection for completion	Net incomplete house	Percentage Balance 3rd Inspection
							2nd installment given	2nd installment not given	Total							
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3-6	10 = 8+9	11	12 = 11-10	13	14	15 = 13-14	16 = 3-14	17 = 10/3*100
1	HANUMANGARH	12905	12770	135	12674	12513	161	231	392	405	13	12136	11945	191	960	3.04
2	SRI GANGANAGAR	20819	20554	265	20478	19819	659	341	1000	1042	42	19512	19257	255	1562	4.80
3	NAGAUR	15734	15464	270	15328	14758	570	406	976	1021	45	14467	14234	233	1500	6.20
4	BANSWARA	81660	80515	1145	79950	75436	4514	1710	6224	6419	195	74160	74012	148	7648	7.62
5	JHUNJHUNU	1034	989	45	974	952	22	60	82	83	1	918	912	6	122	7.93
6	DHOLPUR	5032	4835	197	4759	4255	504	273	777	790	13	4106	4081	25	951	15.44
7	PALI	16050	15226	824	15017	13452	1565	1033	2598	2634	36	13114	12826	288	3224	16.19
8	DAUSA	8487	8195	292	8110	7016	1094	377	1471	1495	24	6810	6786	24	1701	17.33
9	CHITTORGARH	14309	13670	639	13467	11770	1697	842	2539	2587	48	11306	10676	630	3633	17.74
10	SIROHI	16667	15973	694	15770	13624	2146	897	3043	3150	107	13100	12535	565	4132	18.26
11	SIKAR	2342	2149	193	2116	1913	203	226	429	433	4	1811	1654	157	688	18.32
12	AJMER	10598	9983	615	9858	8529	1329	740	2069	2094	25	8295	8292	3	2306	19.52
13	UDAIPUR	66506	61388	5118	59550	52601	6949	6956	13905	14444	539	50249	51433	-1184	15073	20.91
14	BHARATPUR	6804	6570	234	6359	5363	996	445	1441	1500	59	4837	4722	115	2082	21.18
15	JODHPUR	27292	25348	1944	25002	21509	3493	2290	5783	5898	115	20857	20262	595	7030	21.19
16	RAJSAMAND	10041	9388	653	9087	7878	1209	954	2163	2226	63	7277	7162	115	2879	21.54
17	BIKANER	21520	19352	2168	18905	16319	2586	2615	5201	5519	318	15467	15477	-10	6043	24.17
18	BHILWARA	20926	19215	1711	18914	15838	3076	2012	5088	5124	36	15432	14607	825	6319	24.31
19	JHALAWAR	21095	19549	1546	19248	15727	3521	1847	5368	5529	161	15246	15067	179	6028	25.45
20	KOTA	10504	10012	492	9916	7797	2119	588	2707	2731	24	7606	7539	67	2965	25.77
21	ALWAR	5711	5338	373	5152	4216	936	559	1495	1522	27	3784	3506	278	2205	26.18
22	BARAN	17576	16540	1036	16234	12879	3355	1342	4697	4766	69	12584	12294	290	5282	26.72
23	CHURU	12394	10420	1974	9943	9081	862	2451	3313	3346	33	8314	8371	-57	4023	26.73
24	JAIPUR	8447	7708	739	7521	6081	1440	926	2366	2378	12	5701	5616	85	2831	28.01
25	JALORE	26785	24748	2037	24297	19002	5295	2488	7783	7833	50	18091	16653	1438	10132	29.06
26	PRATAPGARH	28604	25905	2699	25120	20028	5092	3484	8576	8724	148	18912	18025	887	10579	29.98
27	JAISALMER	11181	10196	985	9752	7601	2151	1429	3580	3684	104	6951	6194	757	4987	32.02
28	SAWAI MADHOPUR	11087	10042	1045	9701	7417	2284	1386	3670	3706	36	6946	6877	69	4210	33.10
29	BUNDI	18363	16826	1537	16527	12158	4369	1836	6205	6250	45	11773	11015	758	7348	33.79
30	DUNGARPUR	55553	47360	8193	46119	36423	9696	9434	19130	19216	86	35029	33838	1191	21715	34.44
31	BARMER	57237	53388	3849	51366	33954	17412	5871	23283	23595	312	30030	30783	-753	26454	40.68
32	TONK	17332	14195	3137	13641	9366	4275	3691	7966	8033	67	8667	7454	1213	9878	45.96
33	KARAULI	11518	9728	1790	9144	4813	4331	2374	6705	6715	10	4256	2881	1375	8637	58.21
	Total	672113	623539	48574	609999	510088	99911	62114	162025	164892	2867	487744	476986	10758	195127	24.11
